


TMG-ST2021CE 6m x 6m コンテナシェルター

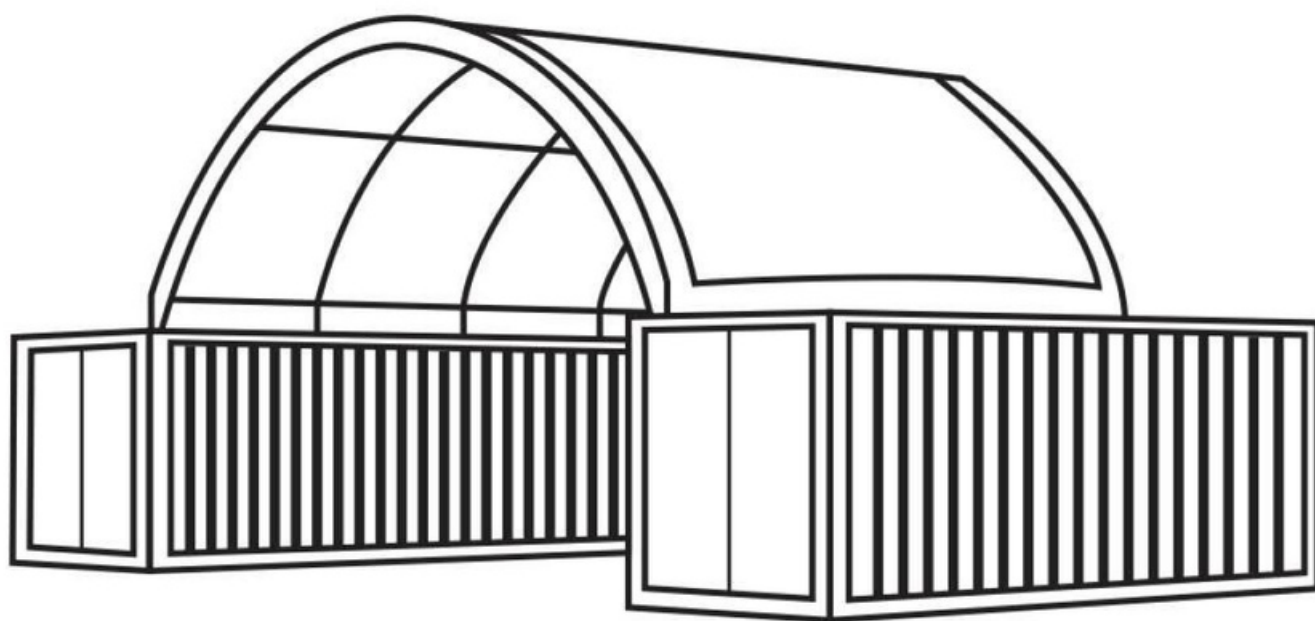

この構造物は大雪や強風に耐えるようには設計されておらず、設計図も付属していません。
お客様の特定の気候条件への適合性を確認するため、特に悪天候に見舞われやすい地域では、使用目的や地域の気候条件への適合性をお客様ご自身でご確認いただく責任があります。

- 組み立て前に製品マニュアルをよく読んで内容を理解してください。
- 部品リストと照合し、すべての部品が揃っていることを確認してください。
- 組み立て時は必ず適切な安全ゴーグルや保護具を着用してください。

部品が不足している場合や組み立てに関するご質問は、info@montaki.ca までメールでご連絡ください。

主な仕様:

組立サイズ: W6 x L6 x H2 (m)

屋根頂部高: 2m + コンテナ高さ

組み立て前に

設置前に説明書をよくお読みください。設置時には、必ずお住まいの地域の安全規則や業界基準に従ってください。規則には以下が含まれますが、これらに限定されません:

- 安全ヘルメット、保護メガネ、作業服
- 高所作業者用の安全ハーネス
- 適切なはしご、ケージ、安全な作業手順


設置前にすべての部品とパーツを確認してください。すべての部品には部品番号が記載されていますので、部品リストを参照してすべて揃っているかご確認ください。


風の弱い日または無風の日に設置してください。強風時の組み立ては困難です。構造物に改造を加えないでください。設置中は部品を含め、フレームに物を吊るさないでください。不適切な設置、無断改造、または極端な天候による損害や怪我については責任を負いかねます。

この建物は人が住居することを目的としていません。


ジョイント部分やカバーと接触するフレーム部分にはテープやフォーム／ゴムを追加することを推奨します。これによりカバーの寿命が延びます。


以下の品目リストを注意深く読み、設置前にすべての部品が含まれていることを確認するため、品数を数えてください。

TMG-ST2021CE 部品一覧				
部品 コード	図解	説明	長さ	数量
1		ドームアーチパイプ	φ48xL2192mm	6
2		中間垂木管	φ48xL1481mm	12
3		ショルダーチューブ	φ48xL1428mm	12
4		屋根母屋	φ42xL1148mm	25
4A		中間トラスコネクタ	W50xL170mm	40
4B		前後コネクタ	W50xL111mm	10
5		中間トラスベースプレート	W150xL200mm	8
5L		左コーナーベースプレート (前後トラス)	W150xL200mm	2
5R		右コーナーベースプレート (前後トラス)	W150xL200mm	2
6		上部カバーテンションチューブA	φ32xL2093mm	4
6A		上部カバーテンションチューブB	φ32xL2030mm	2
12		上部カバー	W6.74xL8.520m	1
13		ラチェット	2T	12
13A		締め付けストラップ	W30xL800mm	12
14		編みロープ	φ8x60m	1束


15		テープ（耐傷性）	φ25mm	1
16		半丸頭ボルト	M10x80mm	50
17		六角ボルト	M10x70mm	72
18		水栓	φ32mm	4
20		タッピンねじ	φ12x25mm	30

ステップ1: ベースプレートのレイアウトと設置

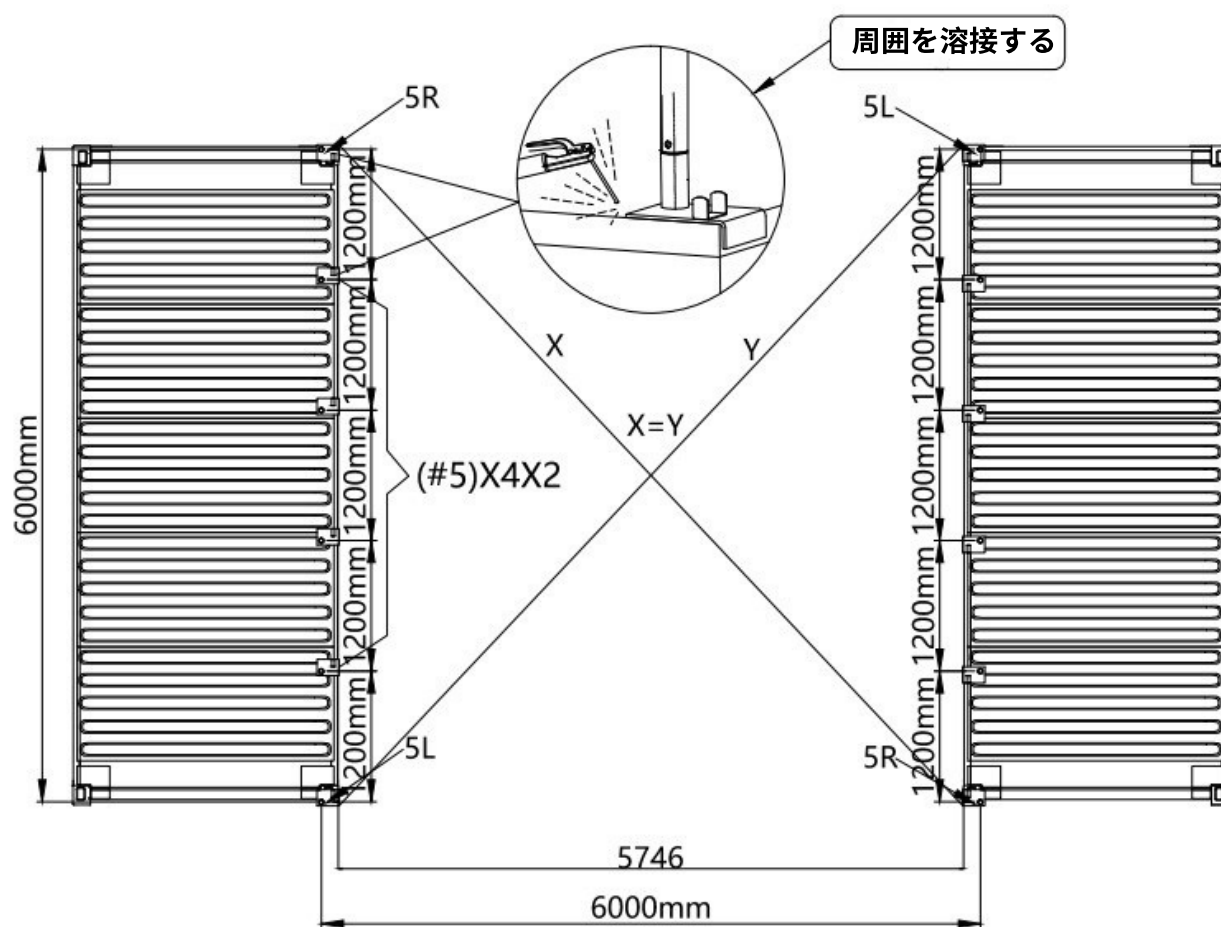


部品 コード	図解	数量
5		8
5L		2
5R		2


ステップ2: トラスを6セット取り付けます。

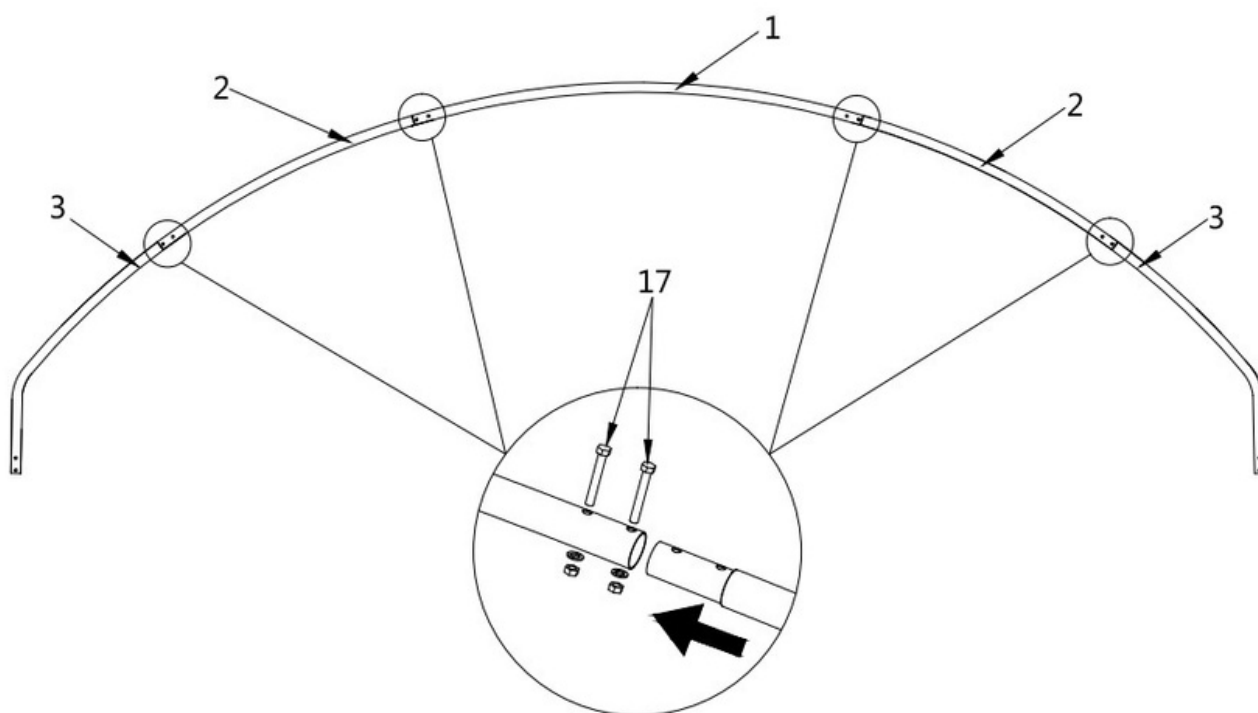


部品 コード	図解	数量
1		1x6
2		2x6
3		2x6
17		8x6

ステップ3: 布地と接合部の摩擦を避けるため、接合部の鋭利な部分に（#15）を巻き付けてください。

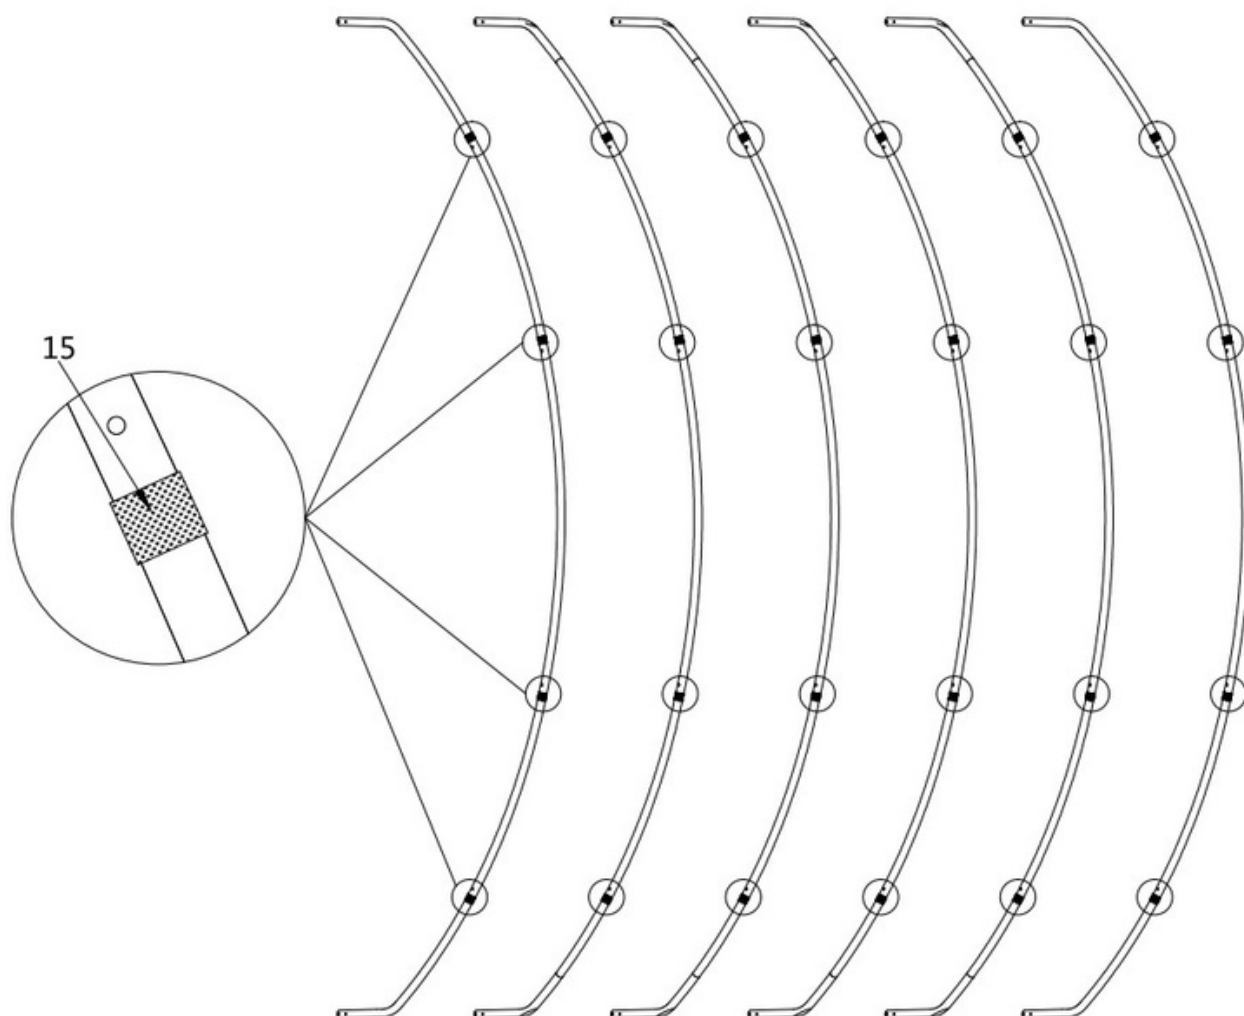


部品 コード	図解	数量
15		1

ステップ4: すべてのトラスを立ててください。

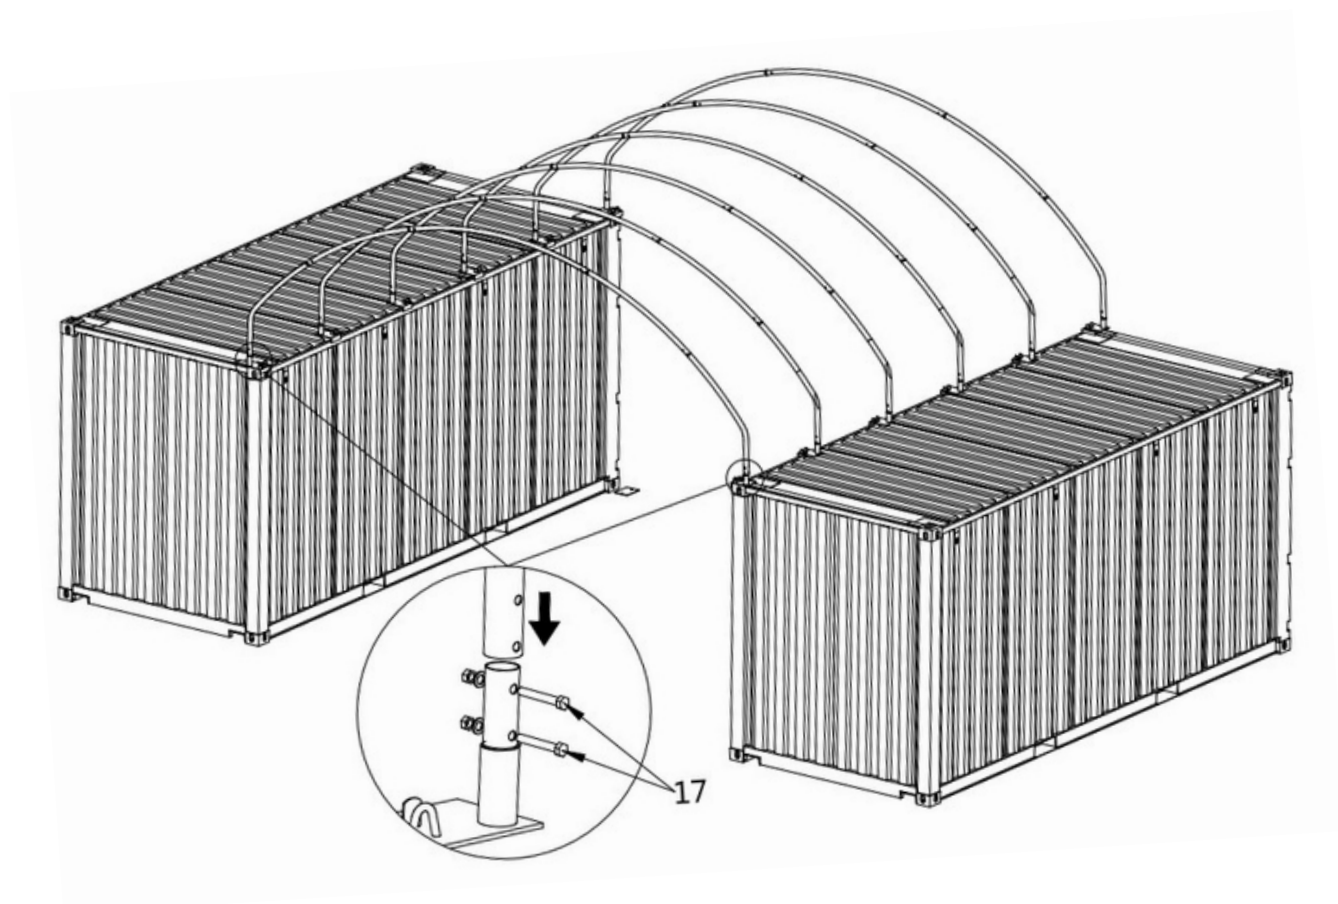


部品 コード	図解	数量
17		24

ステップ5: 屋根母屋の設置してください。

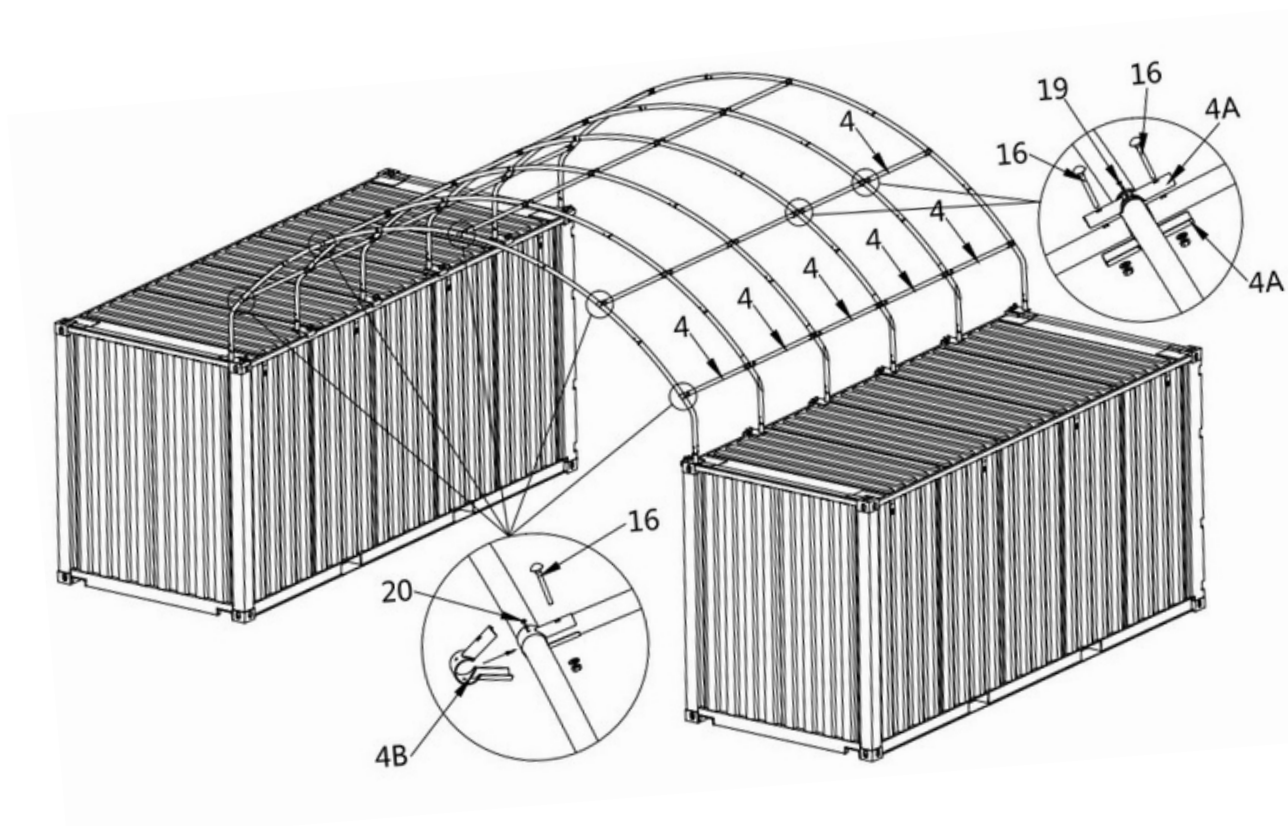


部品 コード	図解	数量
4		25
4A		40
4B		10
16		50
19		30

ステップ6: 上部カバーを取り付けてください。

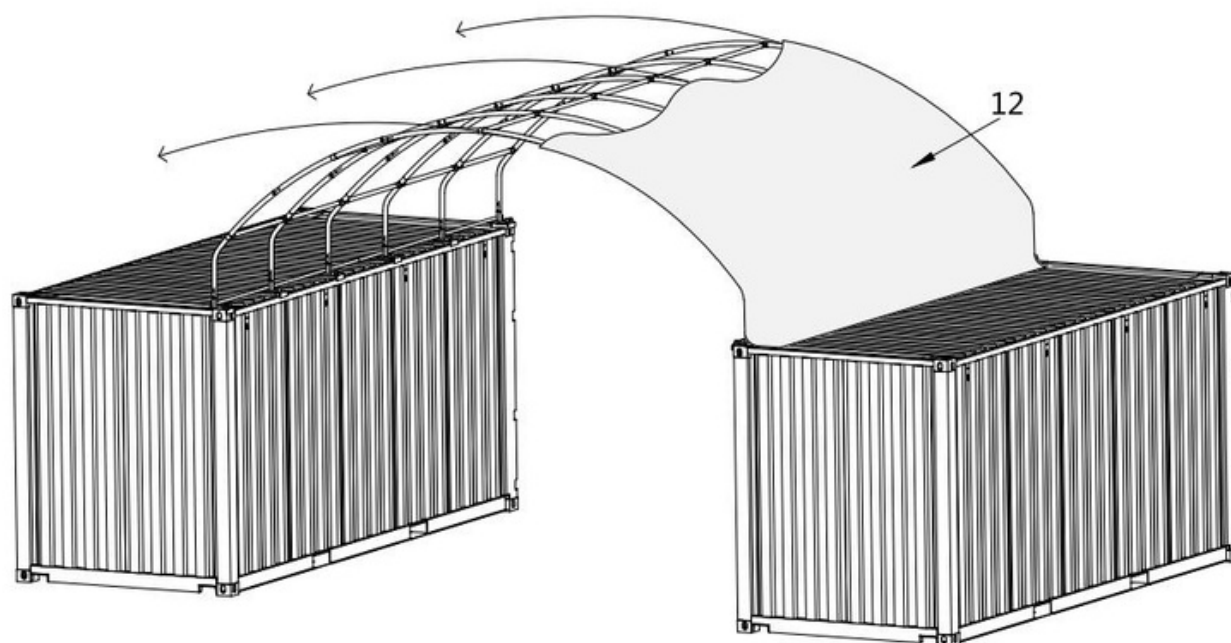


部品 コード	図解	数量
12		1

ステップ7: テンションチューブを取り付けてください。

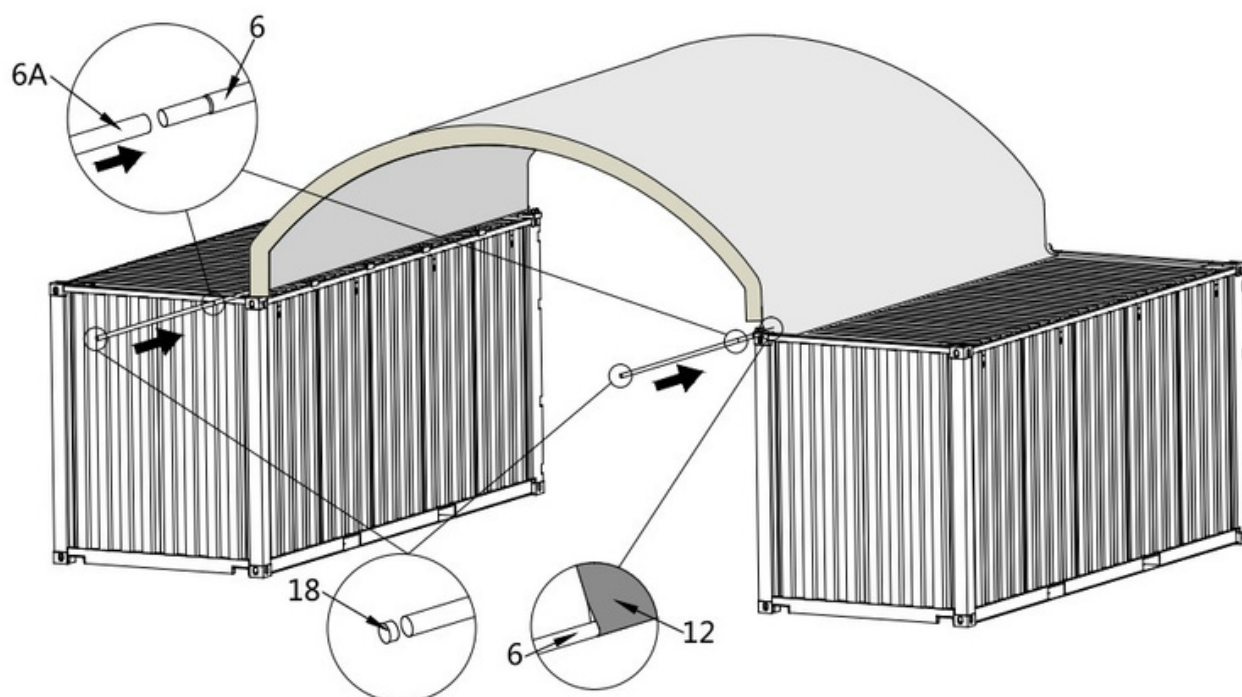

部品 コード	図解	数量
6		4
6A		2
18		4

ステップ8: 張力調整装置と編み込みロープを使って、
上部の布をしっかりと張ってください。

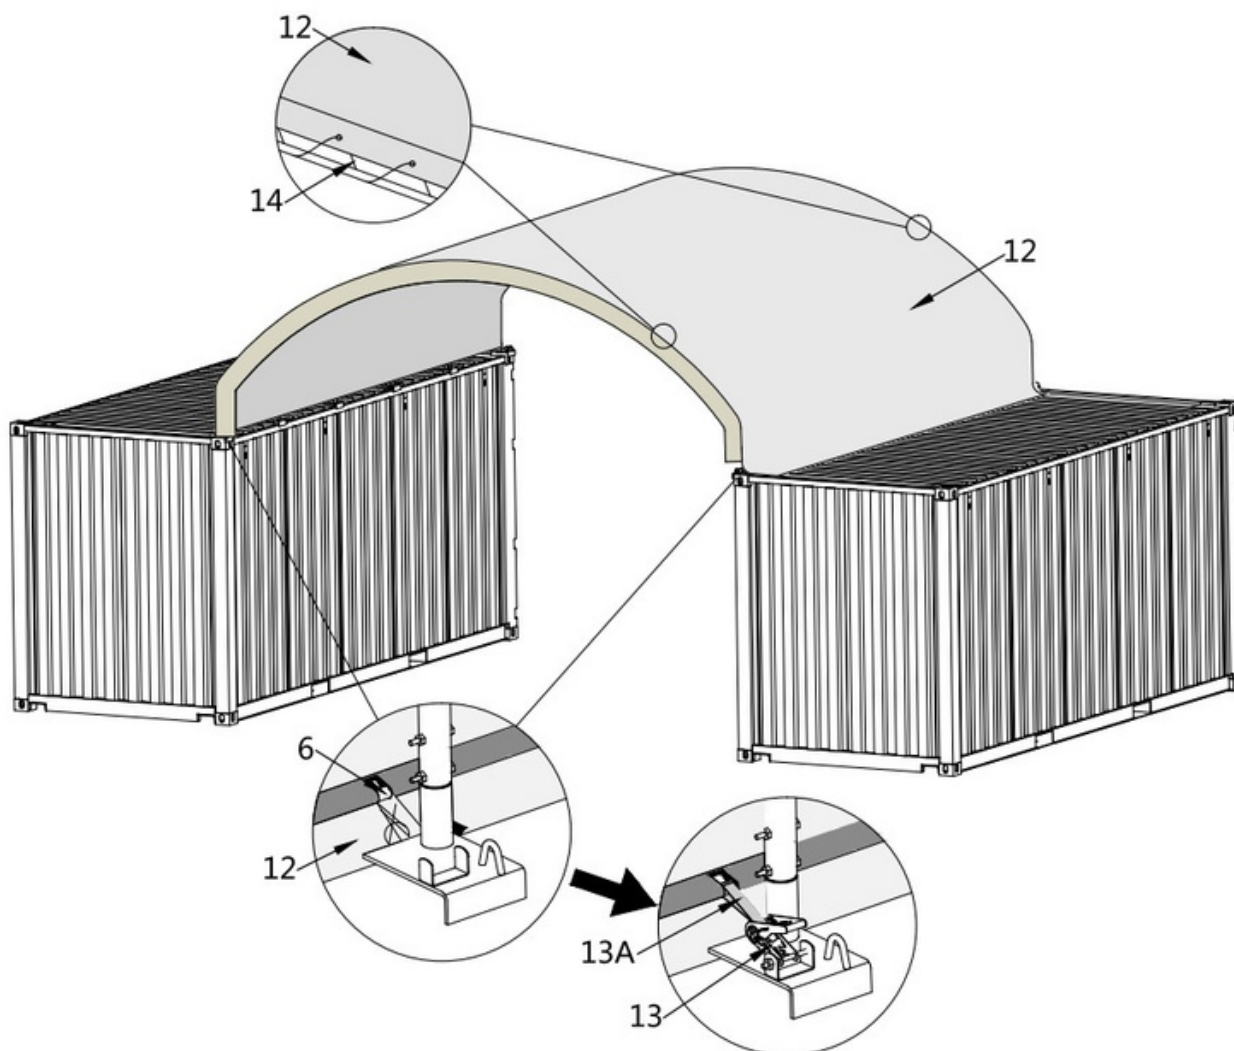

部品 コード	図解	数量
13		12
13A		12
14		1 束

設置後

定期的にシェルター内を歩き回り、すべての部品がしっかりと固定され、シェルター全体が十分に支えられていることを確認してください。すべてのボルトとナット、および接続箇所が適切な位置にあることを確認してください。ベースプレートを確認し、必要に応じてロープと固定具を調整し、カバーを定期的に清掃してください。

屋根カバーに積もった雪は、できるだけ早く取り除かなければなりません。カバーの上で雪が凍りつくと、屋根にかかる重量が増加し、シェルターが倒壊したり、寿命が短くなったりする可能性があります。

屋根に積もった雪は、速やかに除去することを強くお勧めします。屋根に雪を積んだまま一晩放置しないでください。常に建物の周囲1メートル（3フィート）以上の空間を確保してください。建物の側面に雪が積もったり積み重なったりしないようにしてください。そうしないと、側面からの圧力が内側にかかり、倒壊につながる可能性があります。
